

平成 23 年度 鴨川の整備について

1 H23年度の整備予定

公共空間整備

<ジョギングロード等の整備>

- 上賀茂橋～北山大橋右岸の鴨川公園 土系舗装、芝生広場等再整備（約0.1km）
- 高野橋～蓼倉橋左岸の土系舗装（約0.3km）
- 陶化橋～勸進橋右岸の高水敷整備（約0.1km）

<拠点箇所の整備>

- 西高瀬川背割堤の鴨川下流域拠点箇所整備（約0.6km）
- 三条大橋～四条大橋右岸の高水敷のバリアフリー化及び緑化整備（約0.3km）


治水対策

<河川改修>

- 勸進橋～くいな橋右岸の低水護岸の整備（約0.9km）

<中州管理>

- 北大路橋～出雲路橋間の中州除去（約0.7km）
- 松ヶ崎橋～馬橋下流間の中州除去（約0.5km）

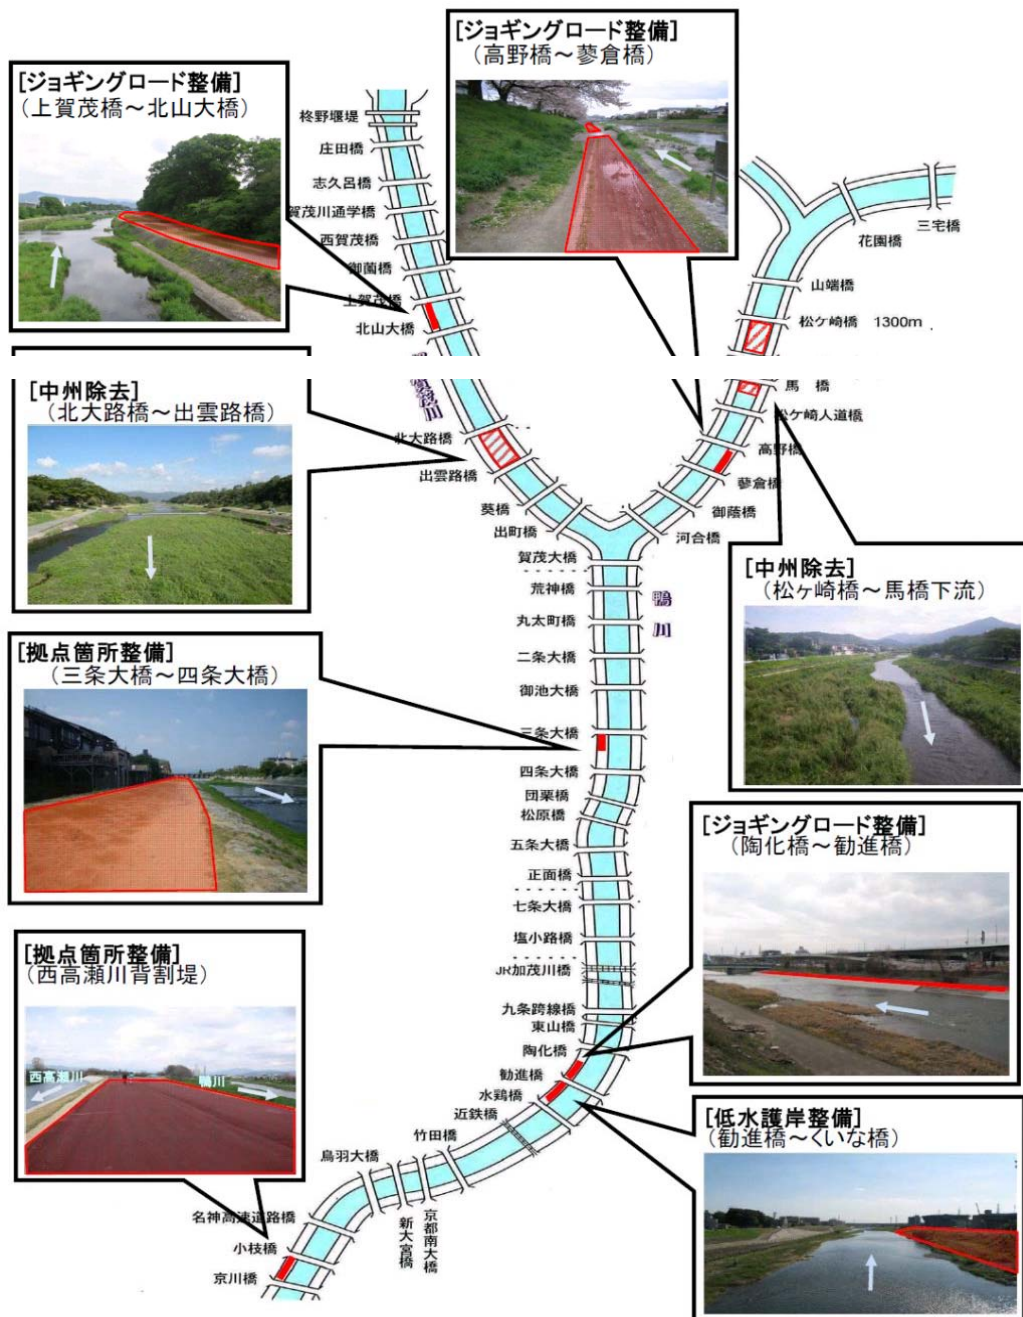

2 三条大橋～四条大橋間右岸の高水敷整備等

府民会議メンバーへのアンケート結果

- 三条大橋から御池大橋間と同様の整備が望ましい(4名)
- 鴨川納涼等の会場であり多くの人が集うため配慮が必要(3名)
- 高齢者等の利用に配慮し、バリアフリー化が必要(3名)
- ベンチ、低木等はない方が良い(4名) ある方が良い(4名)

整備の考え方

アンケート結果より、御池大橋～三条大橋間と同様の整備を求められていることから、同区間の整備内容を踏襲する。また、鴨川納涼の会場にもなることから、「鴨川を美しくする会」の意見を考慮する。

なお、ベンチや低木等の付属施設は、今後の利用状況や府民の声を聞いて検討する。

工事実施において配慮する事項

- 工事目的や利用制限、工事期間等がわかりやすい工事看板の設置
- 景観等に配慮した工事用フェンス等の設置
- 利用制限範囲を限定する施工方法の採用
- 利用者の多い時期を避けた工事期間の設定

整備スケジュール

2箇年(H23～H24)を目途に整備

三条大橋～四条大橋間 延長580m(H23 約300m予定)

整備イメージ



護岸修繕について

三条大橋～四条大橋間の右岸護岸において、深掘れによる損傷があり、出水期中の護岸崩壊等の恐れがあることから、出水期までに応急対応し、出水期明けに高水敷整備とあわせ本整備を実施。



3 西高瀬川背割堤部の整備

主な整備概要

対岸の桜と一体となった桜スポット

- ・ 地元等の意見を踏まえて、シンボルのしだれ桜、様々な色(白、紅、黄など)や開花期間を楽しめる桜(大山桜、里桜など)の植樹、アジサイやユキヤナギなどの季節別に咲く低木の植樹

体に優しい土系舗装の園路、^{あずまや}四阿、ベンチ

工事予定

2箇年(H23~H24)を目途に整備

工事期間 10月中旬~翌年3月末日(予定)

整備イメージ



しだれ桜(シンボル)



(白)



(淡紅)



(濃紅)



(黄色)



(緑)

