



|           |   |      |  |         |      |        |      |
|-----------|---|------|--|---------|------|--------|------|
| 事業名       | 舞鶴市営<br>海岸保全施設整備事業(高潮対策)<br>〈農山漁村地域整備交付金〉   | 事業概要 | 全体計画   |         |      |        |      |
| 地区名       | 竜宮浜漁港海岸地区<br>(舞鶴市字三浜)   |      | ①総事業費 402,050千円<br>②事業目的 離岸堤を嵩上げ改良し波浪の低減と侵食の防止を図る。<br>③事業内容 離岸堤改良 L=138m<br>④事業期間 平成30年度～令和5年度 |         |      |        |      |
| 事業主体      | 舞鶴市   |      | 4年度当初までの実績 ①総事業費 347,050千円<br>②事業内容 離岸堤嵩上改修 L=115m   |         |      |        |      |
| 現況等       | 当地区は住家と船小屋が海岸線のすぐ背後に密集した集落であるが、荒天時に外海からの波浪による影響を受けやすい地形で、H29年21号台風では住家や船小屋に大きな被害が生じた。 |      | 5年度計画(4年度補正含む) ①総事業費 55,000千円<br>②事業内容 離岸堤嵩上改修 L=23.2m   |         |      |        |      |
| 事業効果      | 離岸堤の嵩上げ改良により、激浪時に住家や船小屋への直接の来襲波を防止し、地域住民生活の安心・安全を確保するとともに、砂浜の保全を図る。                   |      | 負担割合 国:50%,府:16.7%,市町:30.3%,その他:3.0%   |         |      |        |      |
| コスト削減     | 既設離岸堤の消波ブロックを流用し、経済的となる整備計画を採用した。   | 年度区分 | 年度   | R4当初まで  | R4補正 | R5     | R6以降 |
| 環境・景観への配慮 | 基礎捨石の投入により藻場が形成され、魚介類の生育場としても良好な環境となる。  |      | 事業費(千円)  | 347,050 | 0    | 55,000 | 0    |

【概要図】

竜宮浜漁港海岸

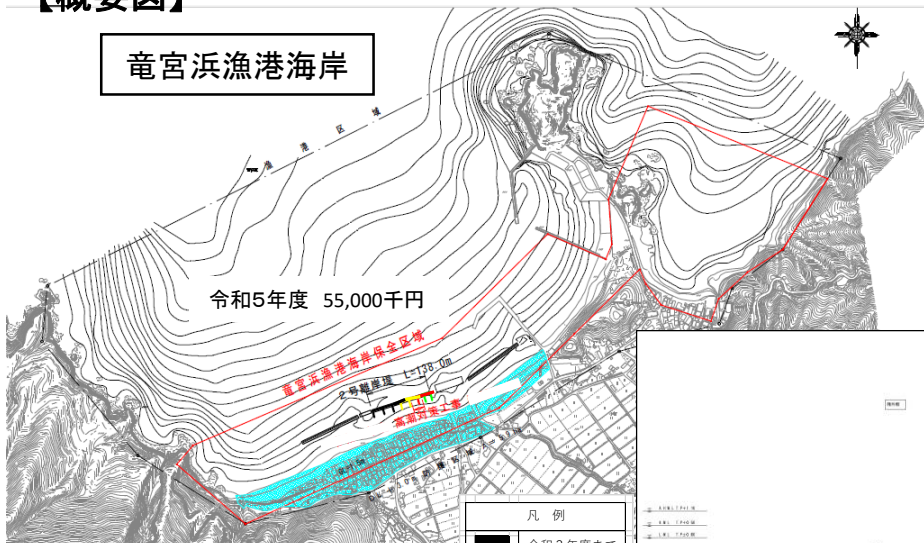

| 凡例 |         |
|----|---------|
| 黒  | 令和3年度まで |
| 黄  | 令和4年度施工 |
| 赤  | 令和5年度計画 |
| 緑  | 令和6年度以降 |

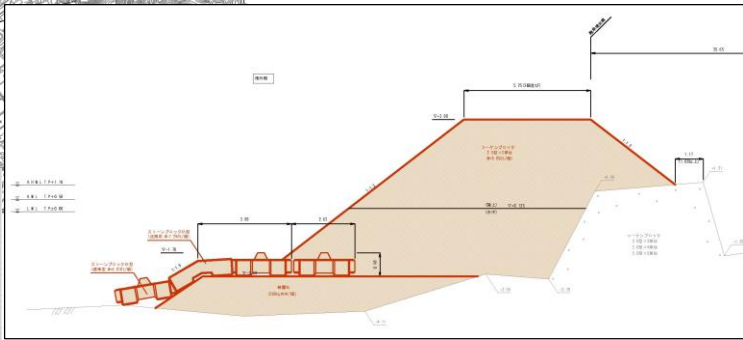

住家に押し寄せる波浪状況



平成29年台風21号被災状況
