

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：京都土木事務所


工事名	鴨川公園 都市公園等災害復旧工事 鴨川公園 単費都市公園施設整備工事
工事概要	台風による出水で公園に堆積した土砂を撤去し、早期に公園機能の復旧を図る都市公園等災害復旧工事である。 工事延長 $L = 295.5m$ <ul style="list-style-type: none"> ・堆積土砂鋤取工 $V = 1,380m^3$ ・堆積土砂処分工 $V = 1,210m^3$ ・真砂土充填工 $V = 480m^3$
随意契約とした理由	平成27年7月16日～18日の台風11号による異常出水で鴨川の水位が警戒水位以上となり、鴨川公園の柵野地区が水没したため土砂が堆積して公園として使用できなくなった。 当公園地区は日頃から利用者が多く、地元からも「一刻も早く利用できるようにしてほしい」旨強い要望があり、緊急に業者を選定する必要があったため、競争入札に付することが困難であり、当該地区の緊急業者と随意契約を締結した。 なお、緊急業者は年度当初に「当該地区における緊急時の社員の動員体制及び施工体制を確保できる業者」として一般競争入札により契約を締結した業者である。 【根拠法令】 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
契約経過	見積依頼 平成27年8月5日 依頼者数1社 見積徴取 平成27年8月6日 見積者数1社 予定価格 23,986,800円(税込) (採用率) 85.1%
契約業者名	トリヤマ・山林建設経常建設共同企業体(代表(株)トリヤマ)
契約金額	20,402,280円(税込)

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 鴨川公園 都市公園等災害復旧工事
鴨川公園 単費都市公園施設整備工事
- (2) 工事番号 京27都公災第6710号の1の1
京27都園単1第6710号の1の1
- (3) 工事場所 京都市北区上賀茂中嶋河原町 地内
- (4) 工事概要 工事延長 $L = 295.5\text{m}$
 ・堆積土砂鋤取工 $V = 1,380\text{m}^3$
 ・堆積土砂処分工 $V = 1,210\text{m}^3$
 ・真砂土充填工 $V = 480\text{m}^3$
- (5) 工期 平成27年8月7日～平成27年11月30日

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等

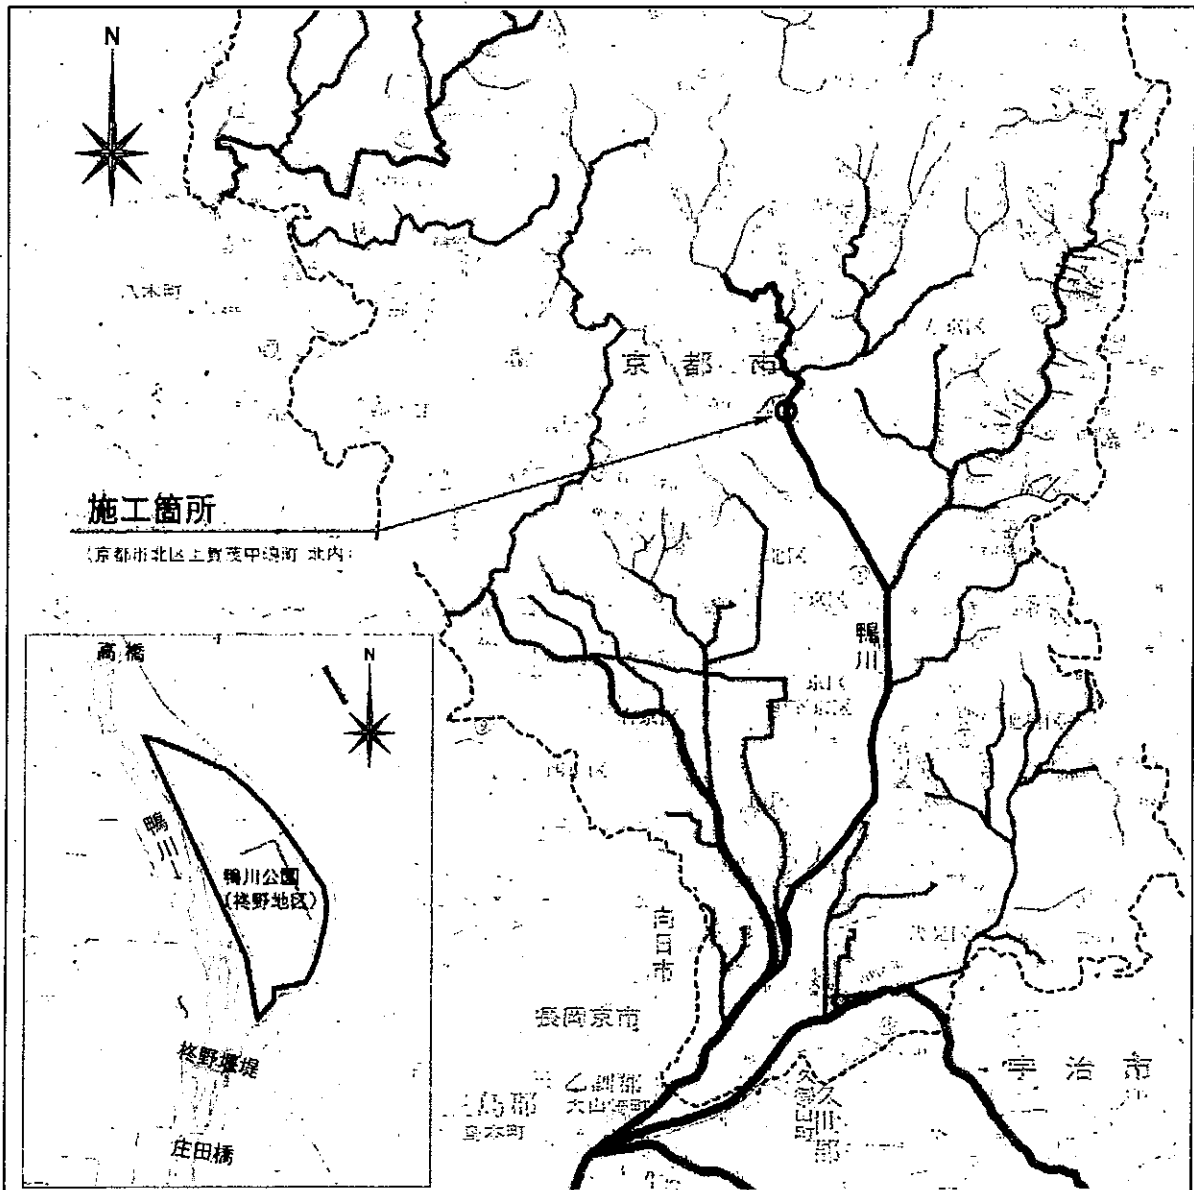

平面図



埋戻し高 = 14.987.8 m
 埋戻し土量 = 1.472.2 m³ 1.410m³

埋戻し高さ = 230.5cm

埋戻し 標準高 A. 埋戻し
 NO. 10-11 1.17.5cm

埋戻し 標準高 B. 埋戻し
 NO. 5-10 1.1.17.0cm

埋戻し 標準高 C. 埋戻し
 NO. 12-14 1.131.0cm


No.10

埋戻し 標準高 D. 埋戻し
 NO. 14-16 1.133.75cm

鴨川

着色部作業範囲

横断面図

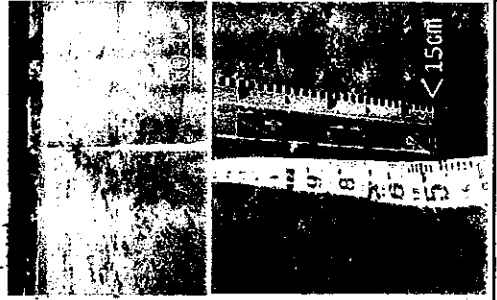

仕上り高さ(基準高さ+30cm)

基準高さ


<15cm

埋戻し


鋤取り

No.10


■H27_鴨川公園(柵野地区:冠水状況)

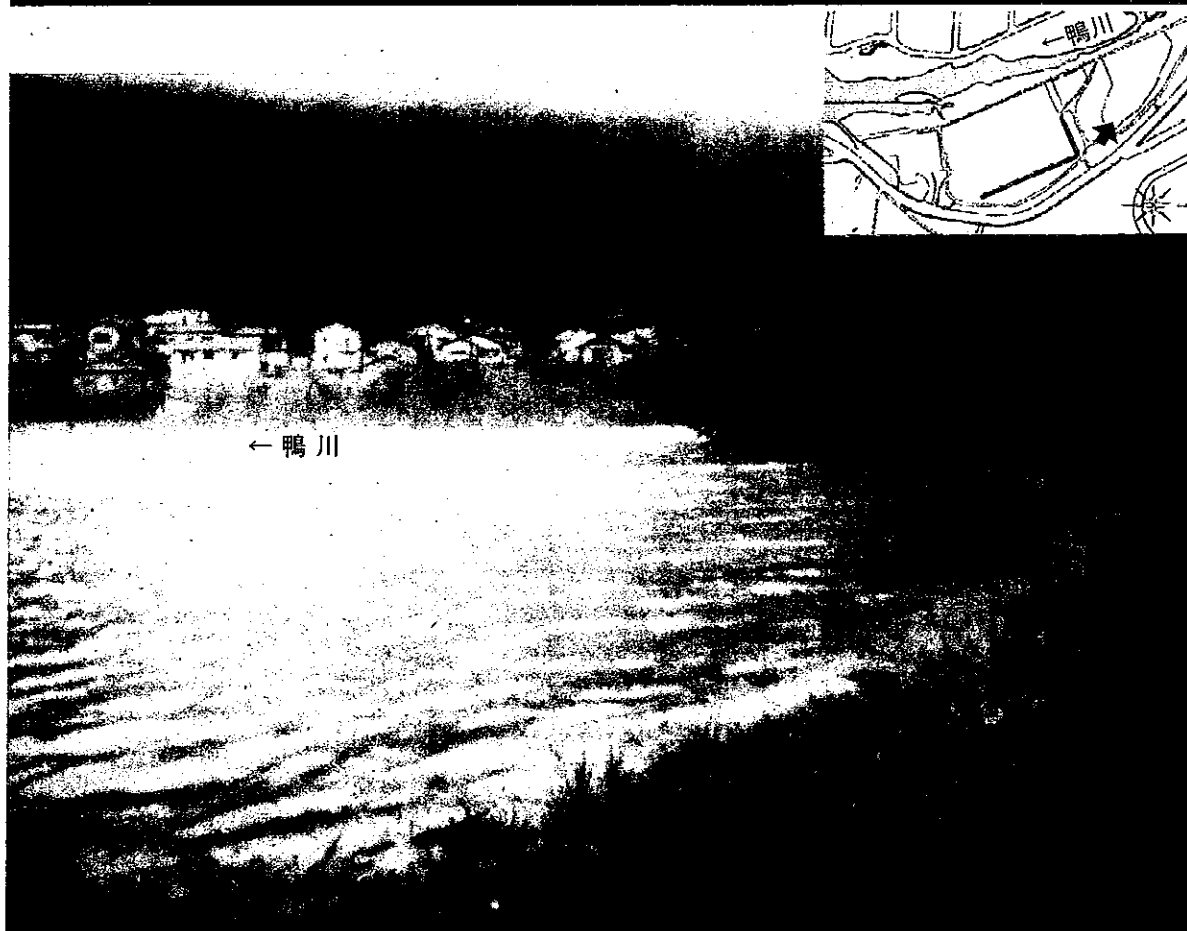

■H27_鴨川公園(柵野地区:被災状況)

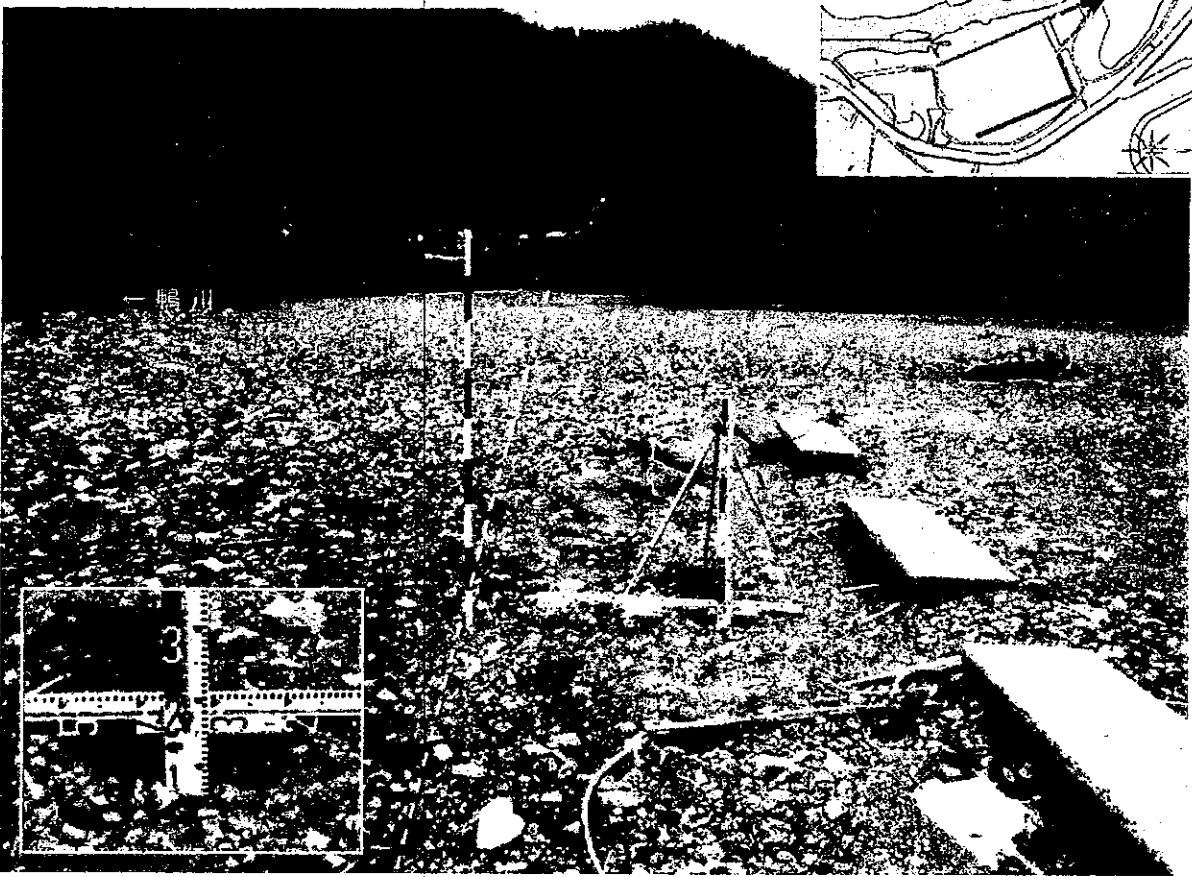

■H27_鴨川公園(柵野地区:復旧工事完了状況)

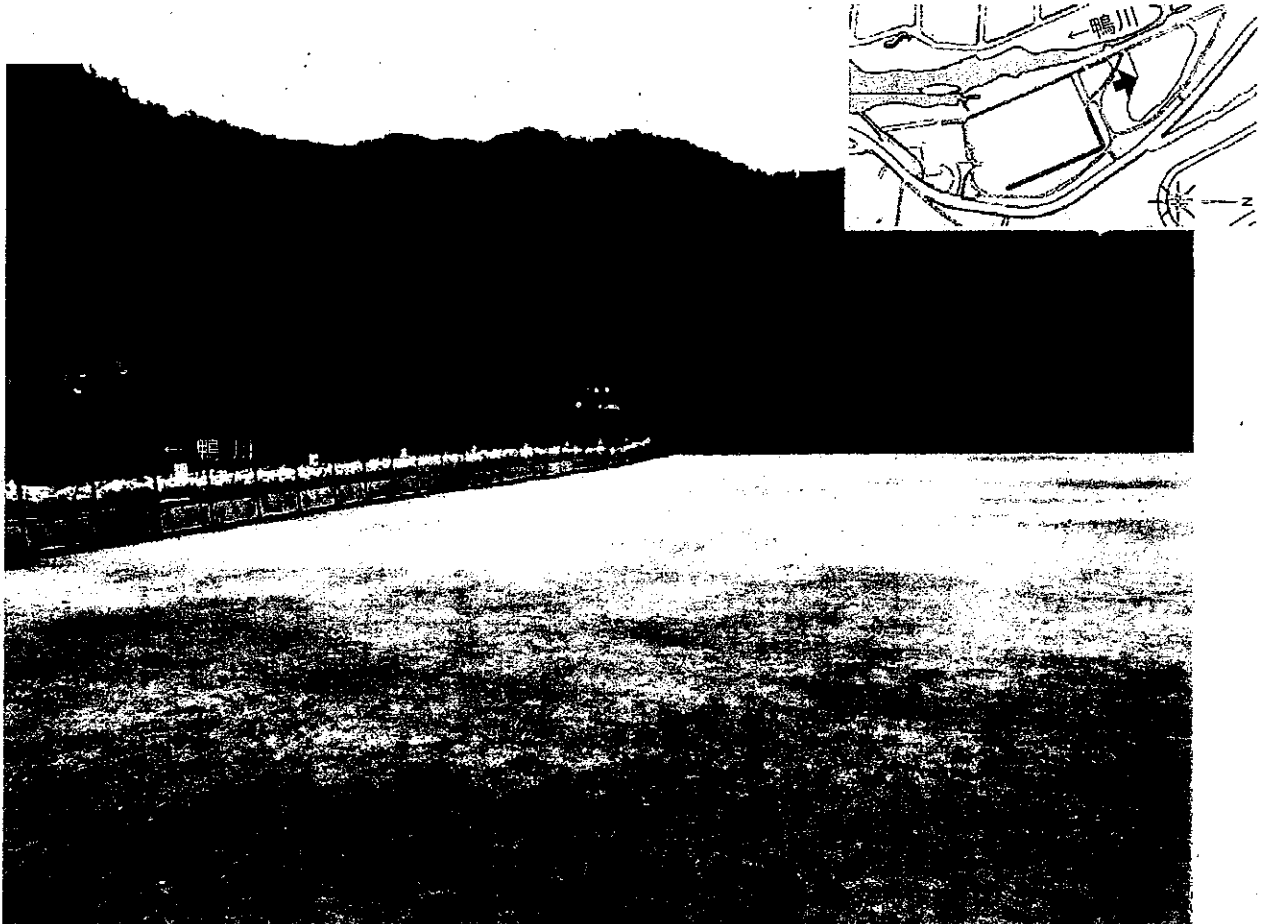

見積結果報告書

(1/1)

施行番号 427-60-0129

工事番号	京27都團単(災害)第6702号の1の1				
工事名	鶴川公園 単費都市公園施設整備(災害)工事				
工事場所	京都市北区上賀茂中鶴河原町地内				
	予 定 価 格	最低制限価格	工事期間	着工 平成 年 月 日	
(税込み)	23,986,800			完成 平成 年 月 日	
見積書比較価格	22,210,000			90 日間	
<p>上記の工事について、下記のとおり見積を執行しましたので、その結果を報告します。</p> <p style="text-align: center;">平成27年8月6日</p> <p style="text-align: center;">京都府知事様</p> <p style="text-align: right;">京都土木事務所長</p>					
見積場所	京都府京都土木事務所		日時	平成 27 年 8 月 6 日 10 時 00 分	
第 1 回 (見積)		第 2 回 (見積)		見 積 人 氏 名	
順 位	金 額	順 位	金 額		摘 要
1	18,891,000			<small>トヨタ・山形建設建設共同有限(株) 下野ギマ</small> 鳥山 昌二 <small>京都市南区</small>	

※上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

別紙 《鴨川公園（柘野地区）災害復旧工事経過》

平成27年

7月 16日(水)~18日(土)	台風11号通過
19日(日)~20日(月)	管内被災状況調査
21日(火)	公共災に申請予定として報告 → 測量着手
8月 3日(月)	測量終了 → 設計書作成
5日(水)	見積依頼
6日(木)	見積書受理 ◆当初契約【単費都市公園施設整備工事】 (工期:8/7~11/4、請負額:20,402,280-)
10日(月)	<u>現場着手</u> 〈9月シルバーウィークまでに利用再開することを目標〉
9月 16日(水)	<u>現場作業完了</u> → 部分使用のための品質及び出来高確認
20日(日)	公園利用再開
10月 22日(木)~23日(金)	災害査定
29日(木)	◆第1回変更契約【単費都市公園施設整備工事】 (工期:8/7~11/30、請負額:21,187,440-)
11月 5日(木)	公共災予算箇所決定
16日(月)	◆第2回変更契約 【都市公園等災害復旧工事・単費都市公園施設整備工事】 (工事名追加のみ)
19日(木)	<u>工事完成届受理</u>
26日(木)	完成検査・目的物引渡
12月 11日(金)	支払い
